


Suivi SDSIN Point projets 2023

Avancement SDSIN / CA du 31/03/2023

Schéma directeur des systèmes d'information et du numérique : rappels

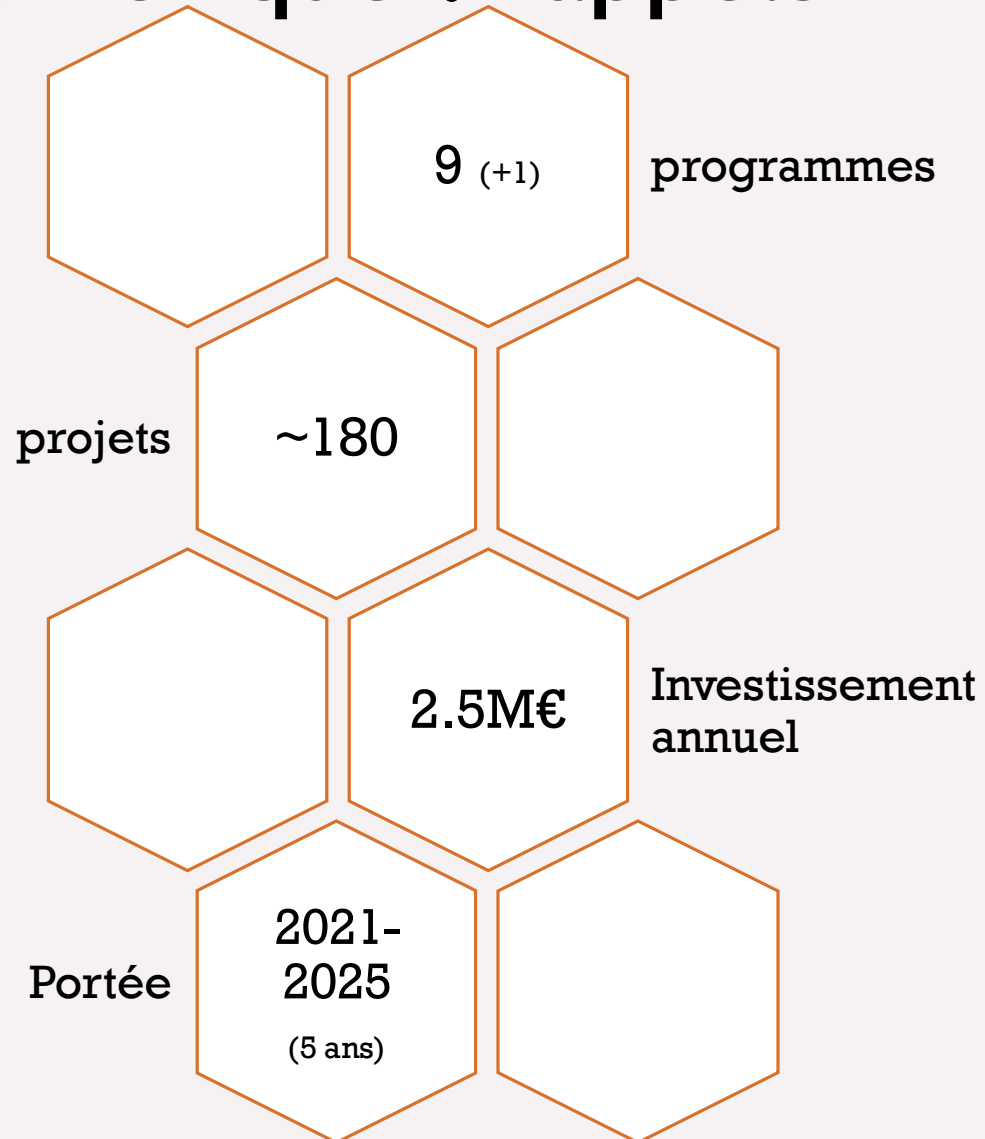

9 programmes SDSIN

P01 Digitalisation de la formation

P02 Digitalisation de la recherche

P03 Communication et collaboration

P04 Services numériques sur le campus

P05 Equipements et aménagement numérique des espaces

P06 Simplification, pilotage et dématérialisation

P07 Accompagnement et gestion du changement

P08 Gestion de la relation aux acteurs externes

P09 Infrastructures, réseaux et socle technique

P10 Evolutions de l'existant

SDSIN / Etat d'avancement global

Programme	_Avancement
P01 Digitalisation de la formation	52.60%
P02 Digitalisation de la recherche	21.88%
P03 Communication et collaboration	35.45%
P04 Services numériques sur le campus	46.67%
P05 Equipements et aménagement numérique des espaces	80.36%
P06 Simplification, pilotage et dématérialisation	34.61%
P07 Accompagnement et gestion du changement	46.67%
P08 Gestion de la relation aux acteurs externes	33.33%
P09 Infrastructures, réseaux et socle technique	54.00%
P10 Evolutions de l'existant	62.00%
Total général	46.15%

Avancement = % effectué
Cible = 50% à mi 2023
(soit à mi SDSIN)

Année	Projets qui auraient du se terminer cette année	Projets terminés	Projets terminés dans l'année ou avant	Projets terminés après l'année prévue	Projets en cours finalisés à + de 90%	Projets en cours finalisés à - de 90%	Achèvement
2019	1	0	0	0	0	0	0%
2020	8	6	5	1	0	0	63%
2021	44	36	34	2	1	3	78%
2022	53	25	25	0	3	10	50%
2023	35	4	4	0	1	7	13%
2024	23	3	3	0	0	2	13%
2025	14	0	0	0	0	3	0%
2026	1	0	0	0	0	0	0%
Total	179	74	71	3	5	25	

Achèvement = projets terminés dans l'année initialement prévue

■ Contexte 2022

- Mobilités DSI et difficultés à recruter = sous-effectifs dès la mi-juin
- Difficultés à assurer la finalisation des projets 2022 = « stock » de projets 2022 à terminer S1 2023

■ Perspectives 2023

- Recrutements effectifs sur le T1 2023
- Anticipation d'un meilleur achèvement des projets en 2023
- MAIS un impact EPE que l'on a encore du mal à mesurer opérationnellement

Principaux projets 2023

Pas
commencé

En cours

Suspendu

Terminé

P03

P04

P05

P06

P09

P10

☐ Refonte AGT

☐ Evolutions BUL →
NextCloud

☐ Annuaire de la recherche

☐ Wifi

☐ Equipements amphis /
salles

☐ GLPI pour scol. ICOM

☐ Mise en place SI Mission
(AMUE)

☐ Gestion des archives papier

☐ Gestion des conventions /
AIRS

☐ Suivi des conventions de
recherche / OSCAR

☐ MCCC v2

☐ Archivage électronique /
CINES

☐ Archivage électronique /
Orchestracteur de flux

☐ Démat de la signature des
conventions de stage

☐ Synchronisation des charges
enseignement (Apogée OSE
ADE)

☒ EPE / Passage à PEGASE

☐ Gestion dématérialisée des
recrutements

☐ Contrôle d'accès

☐ Changement Antivirus

☐ Changement Copieurs

☐ Sauvegarde

☒ EPE / Convergence
référentiel et identités

☒ EPE / Convergence SI
Finance SAP4Hanna

☒ EPE / Convergence SIRH

☒ EPE / Convergence des
services numériques

☐ Migration ADE

☐ Annuaire web v2

☐ Alimentation listes de
diffusion

Principaux arbitrages effectués pour 2023

ETAT	Année	PROGRAMME DU SDSI	PROJET
Abandonné	2023	P01 Digitalisation de la formation	Gestion des examens à distance
Repoussé	2022	P03 Communication et collaboration	Développement du travail collaboratif
Repoussé	2022	P06 Simplification, pilotage et dématérialisation	Gestion des fonctions pédagogiques au sein des référentiels
Repoussé	2022	P10 Evolutions de l'existant	Evolutions Profil (Mon compte) / alias et redirections
Repoussé	2023	P04 Services numériques sur le campus	Application(s) mobile Campus Lyon 2 et amélioration de l'intranet étudiant
Repoussé	2023	P04 Services numériques sur le campus	Carte interactive du campus Lyon 2
Repoussé	2023	P06 Simplification, pilotage et dématérialisation	Gestion des référentiels de l'université (Sinaps)
Repoussé	2023	P06 Simplification, pilotage et dématérialisation	Gouvernance de la donnée
Repoussé	2023	P07 Accompagnement et gestion du changement	Amélioration du portail d'accès aux applications
Repoussé	2024	P06 Simplification, pilotage et dématérialisation	SI Patrimoine

FOCUS Projets EPE (1/2)

- **RAPPELS**

- Priorisation pour 2023/2024 des seuls projets PRIORITAIRES
- Les DSI n'auront pas capacité à porter une convergence complète pour l'ouverture de l'EPE
- Importance du facteur temps
 - il est déjà tard...
 - ... mais les équipes DSI (et métiers) L1 + L2 ont commencé le travail en commun
- Modalités de travail en commun à construire sur les projets
 - L2+AMUE ? L1+L2+AMUE ? ==> Conventionnement, calendrier, définition des équipes projets, des périmètres ...
- Eviter les doublons de travail
 - c'est-à-dire le démarrage de projets sur 2023-2024-2025 qui ont de fortes chances d'être remis en cause dans le cadre de l'EPE
- Charge de travail qui dépasse largement 2025
 - Après les convergences prioritaires, ce sont les convergences secondaires qui seront travaillées

FOCUS projets EPE (2/2)

SI Finances

Objectifs

- Pouvoir construire et exécuter le budget de l'EPE
- Disposer d'un SI Finances unique

Logiciels concernés

- SIFAC

Contraintes

- Préalable = Définition de la structuration budgétaire cible
- Migration SAP4Hanna ?
- Mise en place de la démat de la facture fournisseur, déjà en place sur L1
- Impact process finances/budgets
- Fusion des bases tiers

SI RH

Objectifs

- Payer
- Gérer la carrière
- Appuyer les principaux process RH

Logiciels concernés

- SIHAM
- OSE
- TIMI
- OHRIS

Contraintes

- Reprise de l'existant
- Liens avec référentiel/identités
- Impacts process RH
- Définition à minima de l'organigramme EPE

SI Scolarité

Objectifs

- Disposer d'un SI Scolarité unique EPE
- Moderniser l'existant par le passage à PEGASE

Logiciels concernés

- APOGEE
- ADE
- Indirectement, MOODLE
- eCandidat
- pStage / eSupStage

Contraintes

- Impacts process gestion scolarité et formation
- Offre de formation ?
- Complexité si fusion des 2 APOGEE...
- Mise en place/recrutement d'une équipe projet structurée, DF et DSI

SI Référentiel et identités

Objectifs

- Maintenir et/ harmoniser les mécanismes de création de comptes
- Disposer d'un référentiel d'identités unique et à jour
- Messagerie / @mail EPE

Logiciels et écosystèmes concernés

- Bases référentiels
- Annuaire techniques (LDAP, SUPANN active directory...)
- SI RH
- SI Scol, dans une moindre mesure

Contraintes

- Complexité technique
- Centralité dans les SI des établissements

FOCUS Equipements Numériques / salles et amphis

- P05 Equipements et aménagement numérique des espaces
- Périmètre travaillé avec DIMMO



Rénovation
Audiovisuelle amphis

- PDA
 - V1 et V2
 - Lumière (Changement vidéoprojecteur)
- BDR
 - Laprade
 - Jaboulay (echanges en cours SLA, plutôt fin d'année)



Rénovation
Audiovisuelle salles

- PDA
 - A 103 (rénov. Visio)
- BDR
 - GAIA (une dizaine de salles de cours à reprendre)
 - BELENOS (14 salles avec boitiers AV de 2013)
 - Athéna A 041 et A 043

Merci pour votre attention !
